

事故ゼロを目指して！ 平成29年度 第3回 安全パトロール実施

酒田市建設工事等事故防止対策委員会では、この度、平成29年度第3回目となる安全点検（パトロール）を1月10日（水）に、6箇所の現場を対象として実施しました。今回は「冬場の安全管理」を主眼として実施しましたが、主な点検結果は以下のとおりでしたので、お知らせいたします。

今年度の市発注工事において、冬場を迎え残念ながら事故が発生しております。来年度こそは「事故ゼロ」となるよう、継続して安全点検に取り組みます。

安全パトロールの主な点検結果

○ 模範となる事項
× 改善すべき事項




× 通路へのはみ出し

工事現場に隣接する通路部分にブロックの破片が落ちている。また、工事用のブロックが通路部分にはみ出している。



○ 車止めの配備

現場の従業員駐車場に車止めを複数の配備し、車止めの設置を徹底している。

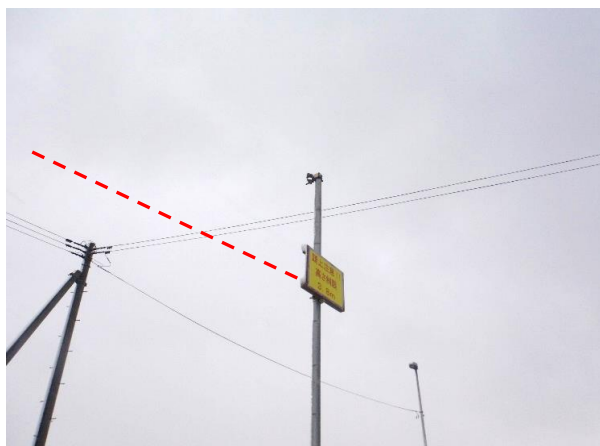

× 高さ制限のロープが張られていない

高さを制限する看板はあるものの、ロープが張られていない。



× 灰皿の下にゴミ箱がある

灰皿のすぐ下にゴミ箱が設置されており、火災の危険がある。



× 掘削現場で簡易土留板の未設置
掘削現場で簡易土留板が設置されていない面があり、法面が崩れる危険性がある。




× 復旧箇所の凸凹が大きい
復旧箇所（仮復旧も含め）で凸凹が大きい箇所がある。



× 工事予告看板の距離表示が合っていない
予告看板の距離表示が実際の工事箇所まで距離と合っていない。



○ 工事用の電源盤に鍵が掛けられている。
工事用の電源盤にそれぞれ鍵を掛けて、安全管理を行っている。

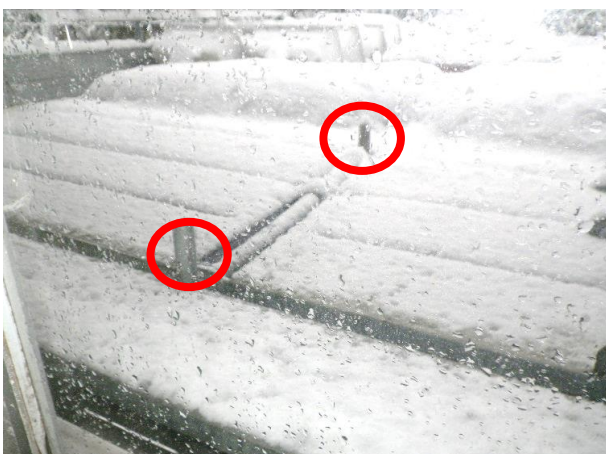

× 荷揚げ用ステージにパイプが出ている
荷揚げ用ステージにパイプが出ているために踏くなどの危険がある。



× 休憩室に吸殻入れが置いてある
屋外に喫煙場所が設置してあるにもかかわらず、休憩室内にも吸殻入れが置いてあり、分煙が徹底されていない。

今年度の安全点検は今回を持って終了の予定です。来年度も発注状況を踏まえ適宜開催いたします。なお、3月には平成29年（1月～12月）に完成検査を実施した工事を対象として、優良企業（現場代理人等）表彰を実施する予定です。
